

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°12 du 10-09-25.docx
	<i>Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du réservoir de Pech Larode - Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals</i>	



S.M. du Limargue et Ségala

Programme 2023 (réalisé en 2025)
Réalimentation du réservoir de Pech Larode
Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals

Compte rendu n°: 12

Réunion du : Mercredi 10 septembre 2025

Prochaine réunion : Mercredi 24 septembre à 14h

Lieu : Local Pech Rouge

Objet : Avancement de la partie ouvrage du Lot 2 (local)

Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.

Le 16 septembre 2025

Lot 1 : Terrassement et pose du réseau AEP			
INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHÉ			
Entreprise STAP <i>Offre de base retenue</i>	524 000,91 € HT		
AVANCE FORFAITAIRE			
L'entreprise a indiqué dans l'acte d'engagement le souhait de solliciter l'avance forfaitaire. ↳ Demande à formuler			
GARANTIE A 1 ^{er} DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE			
Garantie à première demande transmise le 14/02			
ORDRES DE SERVICE ET PV			
Objet	Observations	Date	Date délai final
Délais d'exécution	11 semaines	-	-
Notification du marché	02/09/2024	-	-
Ordre de Service 1	Période de préparation à compter du	28/11/2024	28/12/2024
Ordre de Service 2	Démarrage à compter du	22/01/2025	09/04/2025



S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

CR n°12 du 10-09-25.docx

Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du réservoir de Pech Larode - Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals

AVANCEE DU MARCHÉ

Situation	Date et observation	Montant (€ HT)
Situation n°1	CP 1 envoyé le 10/02 au syndicat pour mandatement	124 710,00
Situation n°2	CP 2 envoyé le 06/03 au syndicat pour mandatement	104 358,00
Situation n°3	CP 3 envoyé le 14/04 au syndicat pour mandatement	215 650,48
Situation n°4	CP 4 envoyé le 07/05 au syndicat pour mandatement	42 880,16
Situation n°5	Projet validé, en cours de traitement	5 342,00
Situation n°6	Projet validée, en cours de traitement	9 439,70
Total facturation		502 380,34



S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du réservoir de Pech Larode - Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals

CR n°12 du 10-09-25.docx

Lot 2 : Construction du local de pompage et mise en place des équipements hydrauliques

INFORMATIONS ET MONTANT DU MARCHÉ

Groupement d'entreprises SAUR / STAP
Offre de base retenue

262 109,94 € HT

AVANCE FORFAITAIRE

Le groupement d'entreprises a indiqué dans l'acte d'engagement le souhait de solliciter l'avance forfaitaire.
↳ Demande à formuler

GARANTIE A 1^{er} DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE

Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre pour éviter la retenue de garantie
(y compris pour la demande d'avance)

ORDRES DE SERVICE ET PV

Objet	Observations	Date	Date délai final
Délais d'exécution	14 semaines	-	-
Notification du marché	02/09/2024	-	-
Ordre de Service 1	Période de préparation à compter du 28/07/25	-	-
Ordre de Service 2	Démarrage du délai d'exécution à compter du 08/09/25	-	15/12/2025

AVANCEE DU MARCHÉ

Factures	Date et observation	Montant (€ HT)
Total facturation		

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°12 du 10-09-25.docx
	<i>Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du réservoir de Pech Larode - Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals</i>	

1 Rappel du contexte

Nature	Observations	Responsable
<i>Réalimentation du secteur Sud Ségala et à terme Ségala Oriental</i>	<p>L'objectif de cette opération est de réalimenter le réservoir de tête de Pech Larode situé sur la commune de MONTET-ET-BOUXAL par l'eau provenant de la station de Gintrac.</p> <p>L'alimentation de ce réservoir permettra de sécuriser le secteur en cas de problème sur la ressource du Bervezou où du Tolorme où soulagera celles-ci l'été en cas de forte demande sur ces secteurs.</p> <p>Les travaux du Lot 1 consistent à renforcer une conduite en fonte 250mm sur 2,3 km.</p> <p>Les travaux du Lot 2 consistent à créer un local de pompage et à y installer un groupe de surpression capable de relever l'eau jusqu'au réservoir de Pech Larode.</p>	PM

Lot 2 : Construction du local de pompage et mise en place des équipements hydrauliques

2 Aspects administratifs

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
<i>Acquisition parcelle</i>	Phase notariale pour acquisition parcelle terminée	PM	Tous
<i>Permis de construire</i>	PC validé. Panneau de chantier à installer sur site au démarrage des travaux. => FAIT	PM	Groupement
<i>Transformateur</i>	<p>Transfo mis en place par TE46.</p> <p>Le câble qui alimente le transfo a été mis en place mais pas comme prévu initialement. Celui-ci se trouve par conséquent dans l'emprise du futur bâtiment.</p> <p>La STAP doit réimplanter celui-ci précisément pour voir si l'on doit faire déplacer le câble à la FDEL. => FAIT</p> <p>↪ A redécaler légèrement pour avoir une petite marge de sécurité lors des travaux. => FAIT</p>		Tous
<i>Panneau d'information</i>	<p>Maquette réalisée par le Syded, visée par le syndicat puis transmise au groupement pour impression.</p> <p>Celui-ci sera affiché à l'entrée du site pour qu'il soit visible depuis la route. => FAIT</p>	PM	Groupement

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°12 du 10-09-25.docx
	<i>Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du réservoir de Pech Larode - Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals</i>	

3 Aspect technique


3.1 Agrément des matériaux et plan EXE

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
Généralités	<p>Matériaux validés précédemment dans la fiche VISA du 14/11/24 et avec les retours SAUR.</p> <p>Appui de fenêtre à bord rond validé</p> <p>Clapet axial refusé devant le local => privilégier un clapet à boule (plus robuste et moins de risque qu'il reste ouvert à cause d'une impureté).</p> <p>Pièges à son à valider.</p>	PM	Groupement / Syded
Livraison	La SAUR indique avoir passé commande de l'ensemble des matériaux.	PM	SAUR
Plan EXE de l'accès et de l'ouvrage	<p>Version 1 : validé avec observations</p> <p>Version 2 validé avec observations (ajout des gaines électrique ainsi que des dimensions de l'ouvrage)</p>	PM	STAP

3.2 Modification

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
Retour d'eau de Pech Larode vers La Salvagie	<p>Du fait de la suppression du brise charge d'Aujals la pression au local de pompage a été modifiée.</p> <p>Afin de permettre l'alimentation du réservoir de la Salvagie depuis Pech Larode certaines modifications devront être réalisées.</p> <p>Le stabilisateur de pression en PN 25 bars qui se trouve dans le regard existant en bordure de RD sera utilisé et permettra d'éviter l'ajout d'un nouveau stab au local.</p> <p>En revanche, le clapet A/R à boule en PN 16 bars qui se trouve dans le même regard devra quant à lui être remplacé par un clapet en PN 25 bars (voir schéma ci-après).</p> <p>Cette solution bien que complexe (à voir si le clapet passe par le tampon DN 800 et selon l'empatement du nouveau clapet si cela nécessite de décaler les pièces aval) reste moins onéreuse et plus fonctionnelle que l'ajout d'un nouveau stab. de pression dans le local ou dans le nouveau regard devant le local.</p> <p>↳ Prix nouveau à transmettre par le Groupement</p>	A TRANSMETTRE	Groupement

A noter également que le poteau incendie existant devra être basculé sur l'antenne en PVC 110mm.

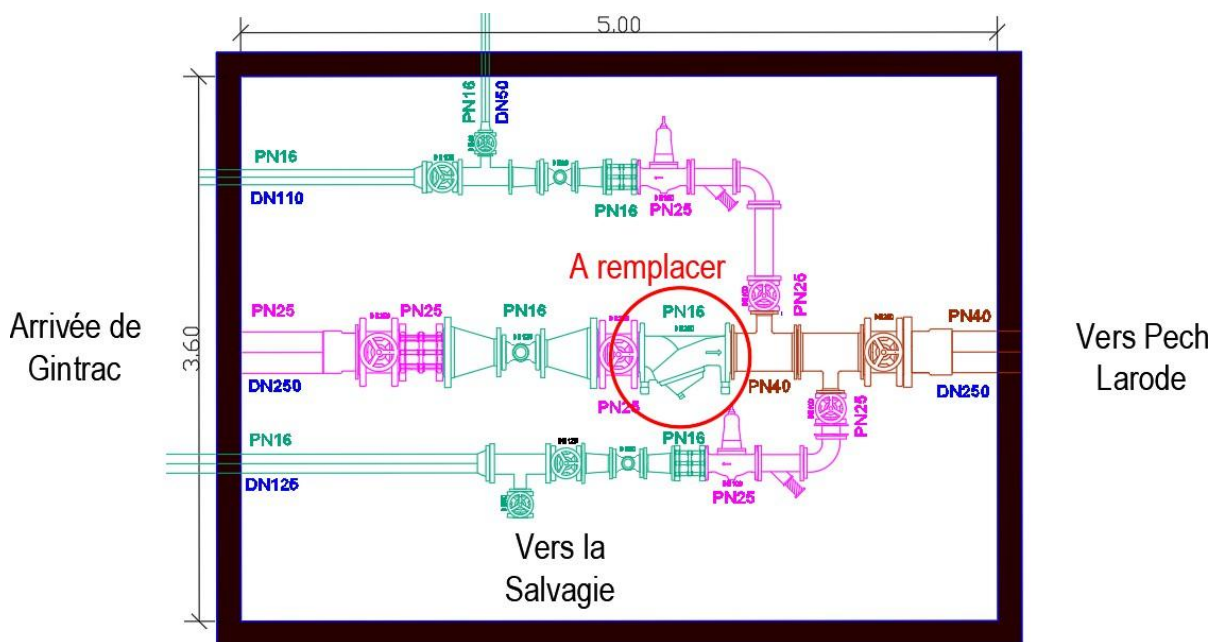

3.3 Avancement des travaux

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
Terrassement et construction du local	<p>Les terrassements ont été réalisés et la piste d'accès empierrée jusqu'au local.</p> <p>Afin d'améliorer la portance 40cm de matériaux d'apport ont été mis en place et compacté (30cm de 20-60 et 20cm de 0/31,5) conformément à ce qui était demandé dans l'étude béton.</p> <p>Le coffrage ainsi que le ferrailage de la dalle de fondation ont été réalisés et sont conformes au plan de ferrailage fourni par le bureau d'étude (y compris renforcement du ferrailage pour les caniveaux techniques). Le coulage de la dalle est prévu le lendemain (11-09). Il est rappelé à la STAP de bien récupérer les bons de livraison du béton (cubage et qualité du béton).</p> <p>La dalle a été agrandie de 5cm soit 25cm une fois terminée.</p>		Groupement

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°12 du 10-09-25.docx
	<i>Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du réservoir de Pech Larode - Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals</i>	

	<p>Le drain pour l'évacuation de la souille a été mis en place. Celui-ci sera raccordé sur le drain mis en place lors de la pose de la conduite en fonte 250mm.</p>		
--	---	--	--

4 Suivis

4.1 Planning prévisionnel

Objet	Observation(s)	Responsable
Planning prévisionnel	<p><u>Semaine 37-38 :</u> 11/09 coulage de la dalle de fondation. Montage des 1^{ers} agglo</p> <p><u>Semaines 39-40 :</u> Respect du temps de séchage (minimum 1 semaine). Préparation coffrage dalle supérieur et caniveau techniques</p>	Tous

4.2 Documents remis

Documents	Observation(s)	Date limite
Plan EXE local version 1 et 2		-
Fiche produit clapet axial		

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°12 du 10-09-25.docx
	<i>Programme 2023 (réalisé en 2025) - Réalimentation du réservoir de Pech Larode - Commune de LACAPELLE-MARIVAL du Foursou à Aujals</i>	

4.3 Documents à remettre

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Plan EXE version 3</i>		-
<i>Prix nouveaux</i>	<i>Relatifs à l'isolation phonique (fibralithe + piege à son) + clapet à boule regard existant de Pech Rouge</i>	-
<i>Etude béton</i>		URGENT

5 Constat

<i>Local Pech Rouge</i>		Observations
Moyen humains et matériels	4 personnes	Variable ; t° 23 degrés
Dimension de la dalle de fondation	7,3 x 6,3m	Qualité du béton C 30/35
Largeur de la dalle de fondation	25cm	
	Non requis <input type="checkbox"/>	

Sécurité, environnement du chantier :

		Observations
Sécurité des tiers : signalisation et balisage corrects	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Sécurité du personnel correcte : casques, chauss. Sécurité, etc.	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Propreté du chantier satisfaisante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Alternat par feux	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Route barrée	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Affichage de l'arrêté de voirie	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Cabane de chantier	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	



Coffrage et ferrailage de la dalle de fondation



Vue du drain



Panneau d'information
