

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°4 du 15-01-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	



S.M. du Limargue et Ségala
Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village
Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS

Compte rendu n°: 4

Réunion du : Mercredi 14 janvier 2026

Prochaine réunion : Mercredi 22 janvier 2026 à 10h30

Lieu : Sur site

Légende : *Élément urgent*, *élément nouveau*, *P.M.* = pour mémoire

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.
Le 15 janvier 2026

MONTANT DU MARCHÉ (partie AEP)			
LOT N°1 : Voirie / Réseaux divers Groupement d'entreprises STAP / GREGORY			176 127,10 € HT
AVANCE FORFAITAIRE			
L'entreprise a indiqué dans l'acte d'engagement le souhait de ne pas solliciter l'avance forfaitaire.			
GARANTIE A 1 ^{er} DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE			
Garantie à première demande transmise par la STAP			
ORDRES DE SERVICE ET PV			
Objet	Observations	Date	Date délai final (hors jours d'intempérie)
Délais d'exécution	6,5 mois	-	-
Notification du marché	18/02/2025	-	-
Ordre de Service 1	Période de préparation à compter du	01/09/2025	27/10/2025
Ordre de Service 2	Démarrage du délai d'exécution	27/10/2025	11/05/2026
AVANCEE DU MARCHÉ			
Situations	Date et observation	Montant (€ HT)	
N°1	Validée et transmise le 08/12 au syndicat pour mandatement	51 749,00	
N°2	<i>A transmettre</i>		
Total facturation		51 749,00	

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°4 du 15-01-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

1 Rappel du contexte

Nature	Observations	Responsable
<i>Renouvellement de réseau AEP</i>	Les travaux consistent à renouveler le réseau AEP en parallèle des travaux de l'opération cœur de village d'ANGLARS. Les compteurs seront également déplacés en limite de domaine public (35 unités concernées). Une partie des travaux sera réalisée en tranchée commune (255 ml) avec le réseau d'eau pluvial et une partie en tranchée seule (1145 ml).	PM

2 Aspects administratifs

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
<i>Permission de voirie RD Et arrêté de circulation</i>	Fait, copie transmise au Syded	PM	SYDED / STAP
<i>Permission de voirie VCC et arrêté de circulation</i>	Fait, copie transmise au Syded	PM	STAP Grd Figeac
<i>Plan EXE</i>	Version 1 transmise le 11/12/25 => Validée avec Rq (suppression vidange rte de Rudelle).	PM	SYDED / STAP
<i>Planning prévisionnel</i>	Version 1 remise le 29/08/2025. ↳ A mettre à jour durant les travaux en fonction de l'avancement.	PM	STAP
<i>Jours intempérie</i>	Intempérie le 06/11, le 07/11, la semaine du 05 au 09/01/26.	PM	STAP

2.1 Agrément des matériaux

Historique cf. CR n°2

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Généralités</i>	Tous les équipements doivent impérativement être validés par le Syded et disposer d'une ACS en cours de validité.	PM	STAP
<i>Fiches produits manquantes</i>	ACS reçue pour la conduite en PVC FITT. Manque la fiche produit.	URGENT RAPPEL	STAP

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°4 du 15-01-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

3 Aspects techniques

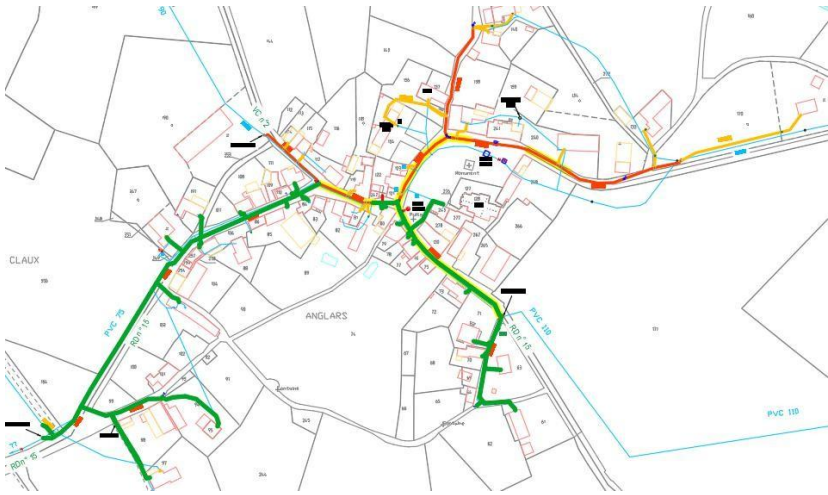
3.1 Organisation, base de vie, stockage des matériaux, évacuation

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
<i>Organisation</i>	Le groupement précise que la STAP s'occupera de la pose des réseaux EP et AEP ainsi que des aménagements de voirie et l'entreprise Gregory des revêtements de voirie.	PM	Tous
<i>Remarque générale</i>	Dans le cas des tranchées communes, veillez à ce que les conduites soient à minima espacées de 15cm et que celles-ci soient espacées également à minima de 15cm de la paroi pour permettre un bon enrobage.	PM	STAP
<i>Stockage des matériaux</i>	Zone de stockage des matériaux derrière la mairie ainsi que sur le délaissé qui se trouve à côté du stade.	PM	Groupement
<i>Base de vie</i>	La base de vie a été installée derrière la mairie.	PM	Groupement
<i>Evacuation des matériaux</i>	Bordereau d'évacuation des déchets à faire signer quand dépôt important chez particulier. Evacuation à Espeyroux chez un agriculteur, convention signée ↳ Copie remise	PM	STAP

3.2 Piquetage et modifications du tracé

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Piquetage</i>	Effectué le 22/10/2025 pour le passage Farral. Effectué le 13/11/2025, pour tt le reste du chantier.	PM	Tous
<i>Modification par rapport au projet initial</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Découverte d'un branchement non recensé parcelle. - Demande de branchement neuf parcelle 247 (devis entreprise en cours, principe validé par le demandeur). - Ajout d'un branchement parcelle 114, actuellement 2 maisons alimentées par le même compteur (devis à faire). - Suppression de la ventouse route de Rudelle avec une surprofondeur. - Il faudra aller voir route de Rudelle chez un particulier pour ajouter une ventouse sur le réseau existant (point haut non ventosé aprioris). 	PM	Tous

3.3 Avancement des travaux

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
Passage Farral	Travaux terminés (hors réfection de voirie). ↳ Reste la tête de vidange béton à faire.	PM	STAP
RD 15 Côté stade	Réseau AEP posé jusqu'au carrefour. Tous les branchements ont été réalisés et sont prêt à être raccordés.	PM	STAP
Antenne en PE 40 vers Rudelle	Antenne en PE 40 posée et remblayée, reste la tête de vidange à faire Branchement parcelle 94 posé et remblayé, remise en état effectuée. Les 2 branchements de la parcelle 97 ont également été réalisés reste réfection de voirie à reprendre.	PM	STAP
RD 15 Route de Rueyres	La conduite en PVC 75 mm a été posée. Les branchements ont été réalisés et sont prêt à être raccordés.	PM	STAP
Place de l'église	La conduite existante en PVC 110 mm a été accrochée ce jour générant une coupure d'eau de 2h environ. La fuite a été réparée.	PM	STAP
Vue générale	 <p>Légende : Trait rouge =partie restante, trait vert = partie terminée</p>	PM	Tous

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	CR n°4 du 15-01-26.docx
---	--	-------------------------

4 Suivis

4.1 Planning prévisionnel

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
Planning	<u>Semaines 03-04 :</u> Traversée de la place de l'église et pose de la conduite dans la ruelle de la mairie ainsi que du branchement de l'ancienne école.	PM	STAP

4.2 Documents remis

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Permissions de voirie et arrêtés de circulation</i>		-

4.3 Documents à remettre

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Situation n°2</i>		PM
<i>Copie du constat d'huissier</i>		



S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village
Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS

CR n°4 du 15-01-
26.docx

5 Constat

Route de Rudelle devant café		Observations
Moyen humains et matériels	2 équipes sur site (1 route de Rueyres et 1 sur la place) 8 personnes STAP ; 2 camions, 3 pelles	Soleil ; t° 13 degrés
Dimension tranchée	0,6m x 1,2m environ	
Conduite	PVC 90 mm – PN 16 bars	
Blindage	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Rocher	<input type="checkbox"/> Pelle <input type="checkbox"/> Brise Roche Non <input checked="" type="checkbox"/>	Brasier (tendre)
Lit de pose	<input type="checkbox"/> Sable <input checked="" type="checkbox"/> Gravette Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>	
Remblais	<input checked="" type="checkbox"/> 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>	
Venues d'eau	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Compactage	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Non requis <input type="checkbox"/>	A la plaque vibrante

Sécurité, environnement du chantier :

		Observations
Sécurité des tiers : signalisation et balisage corrects	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Sécurité du personnel correcte : casques, chauss. Sécurité, etc.	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Propreté du chantier satisfaisante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Alternat par feux	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Route barrée	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Affichage de l'arrêté de voirie	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Cabane de chantier	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	



Conduite en PVC 90mm vers la place



Branchement du café



Conduite existante accrochée et réparée



Branchement parcelle 243 à compacter
