

Espalion, le 19 Juillet 2024

COMPTE RENDU TRAVAUX N°27 (SEM 29)

Sécurisation AEP Secteur Gréalou

Objet : Réunion de chantier
Date : Jeudi 11 Juillet 2024 à 14h00
Lieu : Sur Chantier – Gréalou
Rédacteur : Amélie LAYRAC
Ref : 0724-024/ALA/ESP22-017

Nom	Adresse	Tél/Fax	Présent	Absent	Destinataire	Convoqué Prochaine réunion
Maitre d'Ouvrage : Syndicat Mixte Limargue et Ségala M.PLEIMPONT Gilles (président) Mme. RAUFFET Sylvie (Vice présidente) Mme Magalie LAFARGUE, technicienne	ZA Despeyroux 46 120 Lacapelle Marival Tél. : 05 65 33 44 40 Sicom.eaux.padirac@orange.fr sylvierauffet@orange.fr smls.technique@orange.fr	Tél. : 05 65 33 44 40 GSM: 07 84 71 42 25 GSM: 06 24 94 32 65 GSM: 06 81 78 94 91	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Mairie de Gréalou M. VEDRUNE Michel (maire Gréalou) M. FOUCHER Jacques (adjoint de Gréalou) M. GALES Serge (mairie de Gréalou)	mairie.grealou@wanadoo.fr michelvedrune@orange.fr gales.serge@orange.fr	GSM: 06 33 09 27 49 GSM: 06 07 80 07 84 GSM: 07 49 90 68 68 GSM: 06 38 64 75 73	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Mairie de CARAYAC Mme. GUERRIERI Léa, maire de Carayac	mairiecarayac@wanadoo.fr	Tel : 05 65 40 73 93 GSM 06 68 33-96-28	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Mairie de BEDUER M.CAVAILLE adjoint	mairie.beduer@orange.fr	Tél : 05 65 40 04 66	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grand Figeac Service Route M. PACOT M.THUILLIER	alain.pacot@grand-figeac.fr stephane.thuillier@grand-figeac.fr	GSM: 06 63 69 03 94 TEL: 05 65 34 78 67	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Assistant Maitrise d'Ouvrage SYDED LOT : M. JOLLY Fabien M. EPIAIS Wilfried	fjolly@syded-lot.fr wepiais@syded-lot.fr	GSM: 06 83 49 24 90 GSM: 07 82 16 82 80	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Maitre d'œuvre Sud Infra Environnement : M. PARDON Christian, Directeur Mme LAYRAC Amélie, chargée d'affaires	7, avenue de Laguiole 12500 ESPALION cpardon.espalion.sie@orange.fr alayrac.espalion.sie@orange.fr	Tél.: 05.65.51.55.81 Port : 06 66 86 32 26 Port : 06 40 20 97 95	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
AGENCE DE L'EAU M. SELAS Bruno	bruno.selas@eau-adour_garonne.fr	Tél.: 05 65 75 56 02	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Conseil département du Lot LASCoux Sylvain	sylvain.lascoux@cg46.fr	Tél.: 05 65 53 43 26	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TERRITOIRE D'énergie du lot M. MARLAS Paul	paul.marlas@te46.fr	Tel : 05 65 53 33 33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Exploitant SAUR M. FABRE Aurélien M. PRADINES Fabrice	aurelien.fabre@saur.com fabrice.pradines@saur.com	GSM : 06 79 98 10 16	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Conseil Départemental Route STR Lacapelle M. SOUCAZE	str-lacapelle@lot.fr	Tel :05 65 53 48 30	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CSPS - SOCOTEC M. GROS Mathieu	SOCOTEC Cahors mathieu.gros@socotec.com	Tel : 07 84 58 15 2	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Entreprise QUERCY :Mandataire lot n°1 Mme NAJAC Marion M. LAVERGNE Stephane M. NAJAC Pierre	getp2@wanadoo.fr s.lavergne@quercyentreprise.fr	Tel : 05 65 34 90 31 GSM : 06 64 05 90 31 GSM :06 64 04 90 71 GSM : 06 64 40 90 31	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Entreprise STAP SA :Co traitant lot n°1 M CALMEJANE Jean Lou M CROS Olivier	jeanlou.stap@orange.fr olivier.cros@stap46.fr	GSM :06 08 53 81 93 GSM : 06 86 00 12 41	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
Entreprise VGS : Titulaire lot n°2 M SIMON J marc M.DURAND David	vgs@wanadoo.fr	Tel : 06 80 73 17 38	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

❖ **LOT 1 : Réseaux** **Quercy Entreprise / STAP****1- Administratif :****- Marché lot 1 :**

Notification marché en date 18/10/2023

SMLS

Montant total notifié

1 171 012.11 € HT

OS démarrage des travaux tranche ferme

04/12/2023

Délai TF : 19 semaines + 2 semaines essais

Délai TO 1 : 4 semaines

Délai TO 2 : 1 semaines

OS 1, 2, 3 et 4**Fin des travaux prévus 11 juin 2024****2- Document remis :**

-PV RD19

-DICT

QUERCY

- Suite fiches techniques

Quercy→

SIE/SAUR

- copie convention de décharge parcelle A811

Quercy

-PV Com Com Beduer + Gréalou

QUERCY

-Planning

STAP →

tt inter

- Attestation décennale 2024 pour STAP, transmis au MOA

-Copie Arrêté circulation CD46 RD19

Quercy →SIE

-PV Grand Figeac VC de Carayac

STAP →

tt inter

-Arrêté de circulation chemin + VC Carayac commune Gréalou

STAP →

tt inter

-Plan des bords de voirie

Quercy→

SIE

-Copie permission voirie Carayac

Quercy→SIE

-Copie Arrêté circulation Carayac/Beduer

Quercy→SIE

- Planning au 10 avril 2024

STAP →SIE/MOA

(dépassement de délai

de 1 semaine)

-Plan de montage et implantation EXE LOT 2

Transmis SIE→ SAUR, SYDED

-Arrêté circulation CARAYAC Chambre des vannes

STAP

3- Document à remettre :

-Constat d'huissier

rappel

Quercy/STAP →SIE/MOA

-Plans de recolement STAP

NB : les recolements seront remis en version dwg et pdf, avec mention de la classe de précision A dans le cartouche du plan

-Projet DGD Quercy / STAP

4- Intempérie :

Nombre de jour déclaré par les entreprises et validé par le maître d'œuvre : 1 jour (11 décembre 2023)

Les jours d'intempéries sont décomptés si les opérations de travaux sont arrêtées, si une entreprise travaille, pas d'intempérie décomptée pour l'autre.

5- Moyen mis en œuvre sur le chantier :

QUERCY : chantier replié

STAP : Revêtement en cours

6- Travaux préparatoires:Fournitures :

RAS

7- Avancement du chantier – Questions techniques:**Tronçon 3 : QUERCY (RAPPEL)**

Travaux terminés

Attente voirie (cf paragraphe revêtement)

Bordure posée par STAP à la demande de la mairie (marché grand figeac)

Revêtement bi couche en cours

**Travaux supplémentaires :**

Branchement supplémentaire à « la remise » : voir CR22 et précédents

Tronçon 1 : QUERCY (RAPPEL)

Branchement électrique fonctionnel depuis le 05/07

Rinçage, désinfection et potabilité réalisés

QUERCY

Retour analyse conforme

Réseau en service depuis le 17/07, mise en service délicate par SAUR du fait de la mauvaise ouverture d'une vanne.

Revêtement bi couche en cours

Constats du 04/04/2024 (rappel) voir CR19**Constats au 10/03/2024 après 1er intervention Eiffage (rappel) :**

Voir CR20/21

Constats du 25/04/2024

Voir CR22 et précédents

Constats du 30/05/2024 en présence de M. MARLAS

Voir CR25 et précédents

Chambres des vannes :**Chambre des vannes n°1 Poux des Mas : terminée****Chambre des vannes n°2 Carayac : posée et mise en service****Chambre des vannes n° 3 (accès cimetière, Carayac) : posée et mise en service**

Revêtements terminés

Accotement en terre repris par STAP :

-A valider par le service Voirie Grand Figeac

-Echelle à fixer par STAP

-Réglage stabilisateur à affiner par SAUR si besoin

-Constat, le réseau fonctionne correctement selon les modélisations du projet (vérification des pression au mano et de l'ouverture du stab)



NB : il a été vérifié ce jour que le réseau de maillage de Carayac était fermé (à maintenir fermé pour que les abonnés soient desservis par la CV2 après baisse de pression).

Saur prévoit de le mentionner à leurs plans

Il est validé ce jour, au vu de la présence d'un branchement sur cette antenne (qui va générer un peu de demande), et du faible volume de l'antenne (estimé à environ 500L) de ne pas poser de vanne sur cette antenne

NB : le branchement n'existe pas sur le plan SAUR

Chambre des vannes n° 4

Coupure réalisée

Travaux réalisés, réseau en service

Tronçon 2 : Travaux STAPS rappel

Chambre CV5 : En service

Vidange posée dans drains

Réglage du stabilisateur à 5.5 bars réalisé par SAUR

Fournir carte SIM pour SOFREL LS

SAUR

Tronçon 04 : STAP

Rappel

Voir CR 22 et précédents

Raccordement définitif réalisé, ouvrage remblayé

Branchements Bourg Gréalou:

cf. CR24 et précédents

Prolongation projet mairie le long de la RD :

Travaux réalisés

Essais de pression réseau gravitaire / réseau pression validés, fournir PV

SAUR

Potabilité validée

Coupure réalisée et bascul AEP réalisés

Il est validé que le syndicat paye les réducteurs de pression individuels sur le réseau surpressé (modif de pression à l'initiative du Syndicat), si possible à l'intérieur. Ces réducteurs deviendront propriétés des abonnés

Câblage électrique Eiffage en cours

Eiffage

Point validé : le câblage et la pose éclairage public seront réalisés ultérieurement (commande Grand Figeac en attente)

Lors de la ré-intervention de Eiffage en pied de poteau, les reprise de revêtement seront à leur charge.

Revêtements définitifs réalisés et validés

Reprise des voiries :

Voir CR26

Enduits bi-couche en cours , fin des revêtements programmée le lundi 22/07

8- SPS


Marché :

Cadence participation réunion de chantier : 1 sur 3 réunions

Cadence visite inopinée: 1 sur 3 semaines de chantier

Visites : le 21/12/2023 ; 11/01/2024 ; 22/02/2024 ; 13/03/2024, 11/04/2024, 07/05/2024, 11/06/2024

Dernière visite sur chantier : 11/06

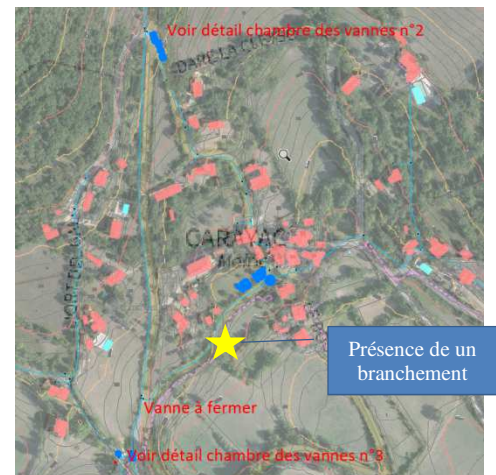

9- Essais de réception et récolement: (Rappel)

- Les plans de récolement seront de classe A, selon annexe au CCTP, pour tous les réseaux.
- Remise dwg+ pdf attendu par SAUR
- Prévoir transformation en format shp pour MOA selon CCTP

QUERCY STAP
A confirmer par SMLS

Attente des plans de Recolement STAP

Urgent STAP

NB : les cartouches de plans devront mentionnés classe de précision A

Réception prévue le Jeudi 01 AOÛT à 14h

❖ LOT 2 : POMPAGE		VGS
--------------------------	--	------------

1- Administratif :- Marché lot 2 :

Notification marché en date 18/10/2023

SIAEP

Montant total notifié

104 932 € HT

Os phase préparatoire

20 11 2023

OS démarrage des travaux tranche ferme

daté au 22/04/2024

Suspension au 24/04

Fin délai contractuel

30/06/2024

Délai tranche ferme : 6 semaines

Sous-traitance: non déterminée

2- Document remis :

-Plan de montage et implantation EXE LOT 2

Transmis SIE → SAUR, SYDED

3- Document à remettre :

- Fiches techniques remises et transmises pour validation à SAUR.

Fiches techniques validées :

-Groupe pompe GRUNDFOS

-Chloration Grundfos Javel Dos EN KIT 20litres de stockage (au lieu de 60L prévu au marché, avec cuve déportée) → volume et dispositif validés par SAUR.

Il est validé de fournir une pompe doseuse en cale sèche

VGS

A laisser sur site dans une caisse plastique fourni par SAUR

SAUR

-DOE

VGS

-Recolement

VGS

-Schéma électrique

VGS

4- Avancement du chantier :

Pose des équipements terminés,

Mise en service du branchement électrique le 05/04

Mise en service Grundfos réalisée

Installation en service depuis le 17/07

5- Intempérie

Néant

6- Moyen mis en œuvre sur le chantier :

Moyens humains : pas d'équipe sur site

7- Etudes et plan d'exécution:

Plan de montage et implantation EXE LOT 2
NB : Aucune observation sur plans transmis

Transmis SIE → SAUR, SYDED

8- Question technique lot n°2

-Tests radio renouvelés, et favorables.

Interface SAUR

-Mise en service réalisée en présence de SAUR



-SAUR prévoit de tester l'installation en situation « de crise », avec l'arrivée de Gréalou depuis Combenoire fermée afin de tester le fonctionnement global du réseau amont et aval+ installation et d'affiner certains réglages si nécessaire

-Essais interne SAUR programmée 1ere semaine de Septembre

Points techniques

-Entrée d'eau par le toit dans la chambre des vannes, VGS rappelle que les moteurs seront au-dessous et que cette situation peut entrainer des défaillances. Le SMLS devra veiller à la réparation de cette entrée d'eau. En cours

Constat ce jour : humidité moindre dans la chambre des vannes, condensation.

Le SMLS souhaite attendre la réparation de la fuite afin de voir l'évolution avant d'engager d'autres actions

Ancienne armoire électrique à récupérer par SAUR
Index compteur sortie réservoir 131m3 à 16h00 le 19/07

9- Réception

Réception avec réserves en cours de signature

Fournir DOE complet rapidement

Levé des réserves, à programmer mi Septembre suite aux essais SAUR

VGS

❖ **PLANNING GENERAL**

Semaine 29 lot 1:

Réalisation des enduits STAP

❖ **PROCHAINES REUNIONS**

Le Jeudi 01 AOUT 2024 à 14h00 (A. LAYRAC) – RECEPTION RESEAUX

Objet : Réunion de chantier

Convoqués : SIE, SMLS, SPS...

LOT 1 réseaux :

14h00 : STAP/QUERCY

Lieu: Pech Favard

❖ **PIÈCES JOINTES :**

RAS

Le présent compte rendu sera réputé accepté par toutes les parties, s'il n'a pas fait l'objet de remarque dans les 5 jours suivant son envoi.
