




SM du Limargue et Ségala
Programme 2024 – Interconnexion entre
Bagnac-sur-Célé et le Trioulou

CR n°3 du 24-09-2024.docx

ORDRES DE SERVICE ET PV		
Objet	Observation	Date délai final
Délai d'exécution	4,5 mois	
Notification du marché	30/07/2024	
Ordre de Service 1	Période de préparation à compter du 08/08/2024	-
Ordre de Service 2	Démarrage des prestations au 12/09/2024 => Envoyé le 16/09/2024 au SMLS pour signature.	27/01/2024
Ordre de Service 3	Suspension des prestations au 17/09/2024 => Envoyé le 16/09/2024 au SMLS pour signature.	-
Ordre de Service 4	Le SMLS souhaite une reprise des prestations au 15/01/2025 => A faire par le SYDED	A déterminer


MONTANT DU MARCHÉ		
Quercy-Entreprise		413 362,90 € HT
AVANCE FORFAITAIRE		
L'entreprise a indiqué dans l'acte d'engagement ne pas souhaiter d'avance forfaitaire.		
GARANTIE A 1 ^{er} DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE		
À définir.		
AVANCEE DU MARCHÉ		
Situations	Date et observation	Montant (HT)
-	-	-
Total facturation		-

DONNEES GENERALES			
<u>Travaux à réaliser :</u>			
Interconnexion avec le syndicat mixte du Limargue et Ségala :			
- Pose de 3,955 km de conduite en PEHD 90 mm entre Bagnac-sur-Célé et le Trioulou.			
- Installation de compteurs de sectorisations et d'équipements de régulation sur le nouveau réseau créé.			
Travaux sur le réseau communal du Trioulou :			
- Installation d'une armoire électrique, d'un dispositif de chloration et d'un analyseur de chlore au réservoir du Trioulou.			
- Pose de 650 ml de conduite au lieu-dit « Le Bousquet » dont 210 ml en PEHD 50 mm et 440 ml en PEHD 32 mm par tubage et reprise de 3 branchements.			
Conducteur de travaux	Stéphane LAVERGNE	Chef de chantier	Patrice CANAT

	SM du Limargue et Ségala Programme 2024 – Interconnexion entre Bagnac-sur-Célé et le Trioulou	CR n°3 du 24-09-2024.docx
--	--	---------------------------

1 Aspects administratifs

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
<i>Plan EXE</i>	À réaliser suite au piquetage.	À faire	TOUS
<i>Sous-traitance</i>	L'entreprise prévoit de sous-traiter l'installation de l'armoire électrique, du dispositif de chloration et de la télésurveillance. Le choix du sous-traitant est en cours. Le DC4 sera à transmettre au SYDED.	À prévoir	SYDED/ Quercy-Ets
<i>Permission de voirie et arrêté de circulation</i>	Demande à faire pour RD28, RD13 et RD16 et voie communale. - RD n°13 et n°16 : il est prévu un alternat avec des feux tricolores. - RD n°28 : une partie travaux est prévue en alternat avec feux tricolores et une partie en route barrée. Le CRD proposera un plan de déviation. La RD est limitée à 19T. Le CRD lèvera cette interdiction pour l'entreprise.	À faire	Quercy-Ets/ CRD Maurs/ STR
<i>Visa fournitures et équipements</i>	Toute modification concernant les fournitures et équipements prévus au marché devra faire l'objet d'une validation préalable par le Moe.	PM	Quercy-Ets
<i>Constat de huissier avant travaux</i>	Un constat doit être réalisé sur l'ensemble du linéaire. => Les fichiers seront à transmettre au SYDED	A faire	Quercy-Ets
<i>Panneau de chantier subventions</i>	Le SYDED transmettra la trame. L'entreprise se charge de l'impression et de l'affichage.	Fait A faire	SYDED Quercy-Ets
<i>Traversée d'Aujou</i>	Un récépissé de déclaration (n°100041066) autorise la traversée du ruisseau d'Aujou. La traversée du ruisseau a été réalisée le 12/09/2024. Un fourreau en PVC a été posé. Les berges ont été remises en état dans l'attente de la reprise des travaux.	Fait	SYDED/ Quercy-Ets

	SM du Limargue et Ségala Programme 2024 – Interconnexion entre Bagnac-sur-Célé et le Trioulou	CR n°3 du 24-09-2024.docx
--	--	---------------------------

2 Aspects techniques

2.1 Base de vie, stockage des matériaux, évacuation


Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
<i>Stockage des matériaux et base de vie</i>	Locaux de l'entreprise situés à Bagnac-sur-Célé.	PM	Quercy-Ets
<i>Évacuation des matériaux</i>	Parcelles de M. M. POUJOLS et M. FRAYSSE.	PM	Quercy-Ets

2.2 Terrassement

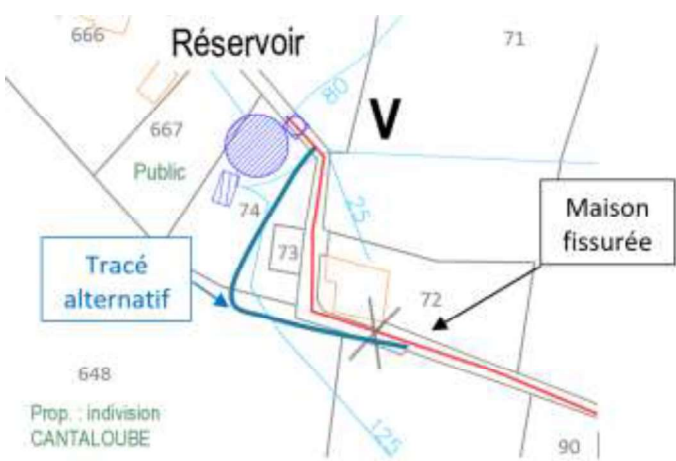
Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Ouverture et remblaiement</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Une largeur de tranchée de 50 cm + DN conduite pour les tronçons ouverts à la pelle mécanique. - L'utilisation d'une chaîne de 25 cm pour les tronçons ouverts à la trancheuse. - Un enrobage avec les matériaux extraits du site pour les tronçons dans les champs. 	PM	Quercy-Ets


2.3 Réfection de voirie

Objet	Observation(s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Voirie communale</i>	A définir.	PM	Trioulou
<i>RD n°16 (réseau principal)</i>	Le STR autorise la traversée de RD en tranchée ouverte avec les remblaiements suivants : <ul style="list-style-type: none"> - En accotement et a < 0,8 m de la rive de chaussée : GNT + 10 cm terre végétale. - Sous chaussée : 17 cm GE + bicouche. 	PM	STR Lacapelle
<i>RD n°13 (réseau secondaire)</i>	Le STR autorise la traversée de RD en tranchée ouverte. Les remblaiements sont à préciser.	PM	
<i>RD n°28</i>	Le CRD autorise l'ouverture d'une tranchée longitudinale (largeur de tranchée 30 cm) avec les remblaiements suivants : <ul style="list-style-type: none"> - En accotement et a < 0,75 m de la rive de chaussée : GNT - Sous chaussée : 5 cm GE + bicouche Si la largeur de l'accotement est < 50 cm la tranchée sera réalisée sous voirie pour ne pas déstabiliser l'accotement.	PM	CRD Maurs

	SM du Limargue et Ségala Programme 2024 – Interconnexion entre Bagnac-sur-Célé et le Trioulou	CR n°3 du 24-09-2024.docx
--	--	---------------------------

2.4 Piquetage et modifications du tracé

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Piquetage</i>	<p>Le piquetage de l'interconnexion sur la commune du Trioulou a été réalisé le 23/09/2024. Une réunion de piquetage pour le tracé sur la partie de Bagnac-sur-Célé est à programmer en octobre.</p>	À prévoir	TOUS
<i>Pont communal traversant la voie SNCF</i>	<p>Le pont ne pourra pas être utilisé pour la traversée des engins (les informations fournies par la SNCF ne permettent pas de connaître le tonnage admissible).</p> <p>La visite terrain a permis de repérer une alternative en passant le long du Célé puis chez M. Didier SOL. Des câbles empêchent actuellement la passage des engins chez M. POPRAWA.</p> <p>=> La commune doit contacter M. POPRAWA pour obtenir son autorisation pour le passage des engins.</p>	PM A faire	SYDED/ Quercy-Ets/ Trioulou
<i>Chemin communal forestier</i>	<p>Le tracé de la nouvelle conduite a été repéré dans le chemin communal et les propriétaires riverains ont été rencontrés. Les arbres abattus devront être débités et mis à disposition des propriétaires riverains.</p> <p>Il est prévu un terrassement à la pelle sur la partie basse du chemin et l'utilisation de la trancheuse sur la partie haute.</p> <p>Lors de la visite, il a été repéré des écoulements sur le chemin traversé. Ces écoulements pourront être canalisés à l'aide d'un merlon, mais aucun d'aménagement n'est à réaliser (busage ou drainage qui nécessitent des autorisations spécifiques).</p> <p>Le chemin longe un fossé qui s'apparente à un cours d'eau. Il conviendra de ne pas impacter ce dernier avec les déblais.</p>	PM	SYDED/ Trioulou/ Quercy-Ets
<i>Modification de tracé avant réservoir du Trioulou</i>	<p>Initialement il était prévu un passage sous-voirie communale mais au vu de l'état des bâtisses il a été décidé de passer par le champs appartenant à l'indivision CANTALOUBE.</p> <p>=> le SYDED édite la convention de passage et la commune se charge de la faire signer par les propriétaires.</p> 	A faire	SYDED/ TRIOULOU

	SM du Limargue et Ségala Programme 2024 – Interconnexion entre Bagnac-sur-Célé et le Trioulou	CR n°3 du 24-09-2024.docx
--	--	---------------------------

2.5 Mise en service

Objet	Observation(s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Opération de raccordement</i>	<p>Le raccordement du nouveau réseau au réseau du SMLS à « Cantaloube » nécessitera une coupure d'eau et une vidange partielle de la conduite existante en Fonte 200 traversant Bagnac-sur-Célé. Le marché prévoit un raccordement de nuit.</p> <p>L'intervention peut être programmée en hiver ou au printemps 2025 donc hors période critique.</p> <p>La SAUR indiquera s'il est possible d'intervenir en journée.</p>	PM A faire	Quercy-Ets/ SAUR

3 Suivis

3.1 Planning prévisionnel

Date	Objet	Responsable
<i>Octobre</i>	Réunion de piquetage secteur de Bagnac-sur-Célé.	TOUS
<i>Février 2025</i>	Début des travaux d'interconnexion du syndicat mixte du Limargue et Ségala. L'entreprise prévoit de commencer par les tronçons dans les champs si la météo le permet.	Quercy-Ets

3.2 Documents à remettre

Pièces	Observation(s)	Date limite	Responsable
<i>Fiche technique et ACS</i>	Conduite en PEHD.	Avant travaux	Quercy-Ets

3.3 Documents remis

Pièces	Observation(s)	Date limite
-	-	-
