	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°1 du 13-11-25.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	



**S.M. du Limargue et Ségala**  
Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village  
*Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS*

**Compte rendu n°: 1**

**Réunion du : Jeudi 13 novembre 2025**

**Prochaine réunion : Mercredi 19 novembre à 10h30**

**Lieu : Sur site**

Légende : **Élément urgent**, P.M. = pour mémoire

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.

Le 17 novembre 2025

MONTANT DU MARCHÉ (partie AEP)			
<b>LOT N°1</b> : Voirie / Réseaux divers Groupement d'entreprises STAP / GREGORY			176 127,10 € HT
AVANCE FORFAITAIRE			
L'entreprise a indiqué dans l'acte d'engagement le souhait de ne pas solliciter l'avance forfaitaire.			
GARANTIE A 1 <sup>er</sup> DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE			
Caution solidaire ou garantie à première demande à transmettre avant la 1ere situation afin d'éviter la retenue de garantie			
ORDRES DE SERVICE ET PV			
Objet	Observations	Date	Date délai final (hors jours d'intempérie)
Délais d'exécution	6,5 mois	-	-
Notification du marché	18/02/2025	-	-
Ordre de Service 1	Période de préparation à compter du	01/09/2025	27/10/2025
Ordre de Service 2	Démarrage du délai d'exécution	27/10/2025	11/05/2026
AVANCEE DU MARCHÉ			
Situations	Date et observation		Montant (€ HT)
<b>Total facturation</b>			

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°1 du 13-11-25.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

## 1 Rappel du contexte

Nature	Observations	Responsable
<i>Renouvellement de réseau AEP</i>	Les travaux consistent à renouveler le réseau AEP en parallèle des travaux de l'opération cœur de village d'ANGLARS.  Les compteurs seront également déplacés en limite de domaine public (35 unités concernées).  Une partie des travaux sera réalisée en tranchée commune (255 ml) avec le réseau d'eau pluvial et une partie en tranchée seule (1145 ml).	PM

## 2 Aspects administratifs

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
<i>DT / DICT</i>	D.T. faites par le Syded en 2022, caduques car trop anciennes.  DICT effectuées par la STAP	PM	SYDED / STAP
<i>Permission de voirie RD Et arrêté de circulation</i>	Fait, copie à transmettre au Syded	PM	SYDED / STAP
<i>Permission de voirie VCC et arrêté de circulation</i>	Fait, copie à transmettre au Syded	PM	STAP Grd Figeac
<i>Plan EXE</i>	A faire	<b>Immédiat</b>	SYDED / STAP
<i>Planning prévisionnel</i>	Version 1 remise le 29/08/2025 ↳ A mettre à jour durant les travaux en fonction de l'avancement	PM	Tous
<i>Plan de déviation</i>	Validé collégialement	PM	Tous
<i>Plan de signalisation</i>	Validé pour les 3 secteurs.	PM	Tous
<i>Constat d'huissier</i>	Fait, copie à transmettre	PM	SYDED / STAP
<i>Panneau d'information</i>	Panneau imprimé et affiché devant l'église	PM	Tous
<i>Jours intempérie</i>	Intempérie le 06/11 (pluie) et le 07/11 (enterrement).	PM	STAP



## S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village  
Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS

CR n°1 du 13-11-  
25.docx

### 2.1 Agrément des matériaux

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Généralités</i>	Tous les équipements doivent impérativement être validés par le Syded et disposer d'une ACS en cours de validité.  Ci-dessous les matériaux validés dans le cadre de l'appel d'offre.	PM	STAP
<i>Matériaux proposés dans l'offre</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>- CRP : Regard préfa béton Ø 1000</li><li>- EJ : Tampon fonte D 400 modèle BRIO</li><li>- MAEC : Regard de compteur modèle Compozit avec tampon classe B125 (sous trottoir)</li><li>- PIPELIFE : Conduite en PEHD PN 16 bars</li><li>- PIPELIFE : Conduite en PVC PN 16 bars modèle Lucoflex</li><li>- PAM : Cône, Té, robinet de prise en charge, BAC réhaussable, bouche incendie,</li><li>- BAYARD : Ventouse triple fonction,</li></ul> Fiche granulométrique de la carrière de la STAP transmise pour le 0/20 et le sable.	PM	STAP
<i>Fiches produits manquantes</i>	Manque les fiche produit suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>- Collier de prise en charge,</li><li>- Vanne à opercule,</li><li>- Manchon de raccordement électrosoudable pour conduite en PEHD,</li><li>- Bride auto butée</li><li>- Ventouse simple fonction</li></ul>	Immédiat	STAP


	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°1 du 13-11-25.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

### 3 Aspects techniques

#### 3.1 Organisation, base de vie, stockage des matériaux, évacuation

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
<i>Organisation</i>	Le groupement précise que la STAP s'occupera de la pose des réseaux EP et AEP ainsi que des aménagements de voirie et l'entreprise Gregory des revêtements de voirie.	PM	Tous
<i>Stockage des matériaux</i>	Zone de stockage des matériaux derrière la mairie ainsi que sur le délaissé qui se trouve à côté du stade	PM	Groupement
<i>Base de vie</i>	La base de vie a été installée derrière la mairie.	PM	Groupement
<i>Evacuation des matériaux</i>	Bordereau d'évacuation des déchets à faire signer quand dépôt important chez particulier.	PM	STAP

#### 3.2 Piquetage et modifications du tracé

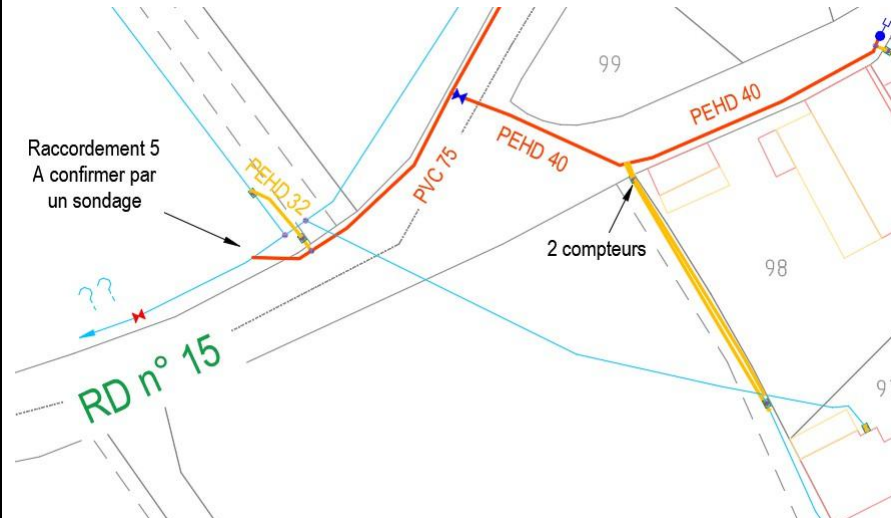Objet	Observation (s)	Avancé e / Date	Responsabl e
<i>Piquetage</i>	Effectué le 22/10/2025 pour le passage Farral. Effectué le 13/11/2025, pour tt le reste du chantier.	PM	Tous
<i>Modification par rapport au projet initial</i>	<p>Raccordement route de Rudelle : il semblerait que l'antenne continue, la ventouse prévue sera donc supprimée (à confirmer avec sondage).</p> <p>Le branchement de la stabu. sera réalisé en PE 32 et non en PE 40.</p> <p>L'antenne en 40 prévue pour alimenter la parcelle 97 sera remplacée par 2 branchements distincts (chemin privé).</p> 	PM	Tous

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°1 du 13-11-25.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

### 3.3 Avancement des travaux

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
Passage Farral	<p>Les travaux de terrassement et de pose du réseau AEP sont terminés, reste à compacter et à niveler proprement la tranchée.</p> <p>Les 4 branchements ont été repris et la vidange mise en place.</p> <p>↪ Reste la tête de vidange béton à faire.</p>	PM	STAP

## 4 Suivis

### 4.1 Planning prévisionnel

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
Planning	<p><u>Semaine 47 :</u></p> <p>Finition du remblaiement passage Farral et pose des réseaux en direction de la place</p>	PM	STAP

### 4.2 Documents remis

Documents	Observation(s)	Date limite
-	-	-

### 4.3 Documents à remettre

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Fiches produits manquantes</i>	<i>Voir article agrément des matériaux</i>	<b>Immédiat</b>
<i>Plan EXE</i>		<b>Immédiat</b>
<i>Copie du constat d'huissier</i>		PM
<i>Permissions de voirie et arrêtés de circulation</i>		Immédiat



## S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village  
Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS


CR n°1 du 13-11-  
25.docx

### 5 Constat

	Passage Farral	Observations
Moyen humains et matériels	2 personnes STAP ; 1 chargeuse	Soleil ; t° 17 degrés
Largeur tranchée	Pas de terrassement en cours	
Conduite	PEHD 40 mm – PN 16 bars	
Blindage	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Rocher	<input type="checkbox"/> Pelle <input type="checkbox"/> Brise Roche Non <input type="checkbox"/>	Tout venant
Lit de pose	<input checked="" type="checkbox"/> Sable <input type="checkbox"/> Gravette Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>	
Remblais	<input checked="" type="checkbox"/> 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>	
Venues d'eau	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Compactage	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Non requis <input type="checkbox"/>	A terminer

### Sécurité, environnement du chantier :

		Observations
Sécurité des tiers : signalisation et balisage corrects	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Sécurité du personnel correcte : casques, chauss. Sécurité, etc.	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Propreté du chantier satisfaisante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Alternat par feux	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Route barrée	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Affichage de l'arrêté de voirie	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Cabane de chantier	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	

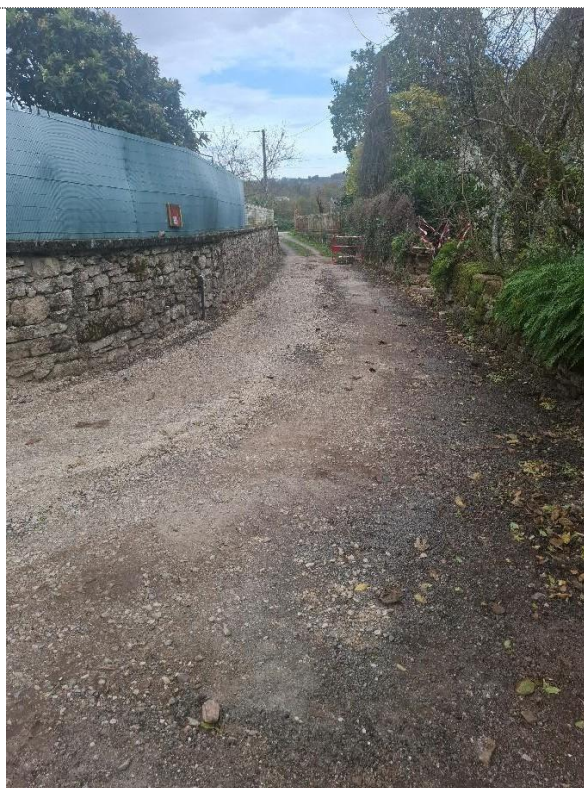

*Remblaiement passage Farral avec conduite en PEHD en attente pour raccordement*
