

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°3 du 10-12-25.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	



**S.M. du Limargue et Ségala**  
Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village  
*Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS*

**Compte rendu n°: 3**

**Réunion du :** Mercredi 10 décembre 2025

**Prochaine réunion :** Mercredi 07 janvier 2026 à 10h30

**Lieu :** Sur site

*Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire*

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.  
Le 11 décembre 2025

MONTANT DU MARCHÉ (partie AEP)			
<b>LOT N°1 :</b> Voirie / Réseaux divers Groupement d'entreprises STAP / GREGORY			176 127,10 € HT
AVANCE FORFAITAIRE			
L'entreprise a indiqué dans l'acte d'engagement le souhait de ne pas solliciter l'avance forfaitaire.			
GARANTIE A 1 <sup>ère</sup> DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE			
Garantie à première demande transmise par la STAP			
ORDRES DE SERVICE ET PV			
Objet	Observations	Date	Date délai final (hors jours d'intempérie)
Délais d'exécution	6,5 mois	-	-
Notification du marché	18/02/2025	-	-
Ordre de Service 1	Période de préparation à compter du	01/09/2025	27/10/2025
Ordre de Service 2	Démarrage du délai d'exécution	27/10/2025	11/05/2026
AVANCEE DU MARCHÉ			
Situations	Date et observation	Montant (€ HT)	
N°1	Validée et transmise le 08/12 au syndicat pour mandatement	51 749,00	
<b>Total facturation</b>			51 749,00

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°3 du 10-12-25.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

## 1 Rappel du contexte

Nature	Observations	Responsable
<i>Renouvellement de réseau AEP</i>	<p>Les travaux consistent à renouveler le réseau AEP en parallèle des travaux de l'opération cœur de village d'ANGLARS.</p> <p>Les compteurs seront également déplacés en limite de domaine public (35 unités concernées).</p> <p>Une partie des travaux sera réalisée en tranchée commune (255 ml) avec le réseau d'eau pluvial et une partie en tranchée seule (1145 ml).</p>	PM

## 2 Aspects administratifs

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
<i>Permission de voirie RD Et arrêté de circulation</i>	Fait, copie à transmettre au Syded.	RAPPEL	SYDED / STAP
<i>Permission de voirie VCC et arrêté de circulation</i>	Pas reçu du Grand Figeac => A FAIRE	RAPPEL	STAP Grd Figeac
<i>Plan EXE</i>	Transmis ce jour, en cours de VISA.	PM	SYDED / STAP
<i>Planning prévisionnel</i>	<p>Version 1 remise le 29/08/2025.</p> <p>👉 A mettre à jour durant les travaux en fonction de l'avancement</p>	PM	Tous
<i>Jours intempérie</i>	Intempérie le 06/11 (pluie) et le 07/11 (enterrement).	PM	STAP

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°3 du 10-12-25.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

## 2.1 Agrément des matériaux

Historique cf. CR n°2

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Généralités</i>	Tous les équipements doivent impérativement être validés par le Syded et disposer d'une ACS en cours de validité. Ci-dessous les matériaux validés dans le cadre de l'appel d'offre.	PM	STAP
<i>Fiches produits manquantes</i>	Manque la fiche produit et l'ACS de la conduite PVC FITT.	<b>URGENT RAPPEL</b>	STAP

## 3 Aspects techniques

### 3.1 Organisation, base de vie, stockage des matériaux, évacuation

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
<i>Organisation</i>	Le groupement précise que la STAP s'occupera de la pose des réseaux EP et AEP ainsi que des aménagements de voirie et l'entreprise Gregory des revêtements de voirie.	PM	Tous
<i>Remarque générale</i>	Dans le cas des tranchées communes, veillez à ce que les conduites soient à minima espacées de 15cm et que celles-ci soient espacées également à minima de 15cm de la paroi pour permettre un bon enrobage.	PM	STAP
<i>Stockage des matériaux</i>	Zone de stockage des matériaux derrière la mairie ainsi que sur le délaissé qui se trouve à côté du stade	PM	Groupement
<i>Base de vie</i>	La base de vie a été installée derrière la mairie.	PM	Groupement
<i>Evacuation des matériaux</i>	Bordereau d'évacuation des déchets à faire signer quand dépôt important chez particulier. Evacuation à Espeyroux chez un agriculteur, convention signée <a href="#">📄 Copie remise</a>	PM	STAP

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°3 du 10-12-25.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

### 3.2 Piquetage et modifications du tracé

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Piquetage</i>	Effectué le 22/10/2025 pour le passage Farral. Effectué le 13/11/2025, pour tt le reste du chantier.	PM	Tous
<i>Modification par rapport au projet initial</i>	<p>Raccordement route de Rudelle : il semblerait que l'antenne continue, la ventouse prévue sera donc supprimée (à confirmer avec sondage).</p> <p>Le branchement de la stabu. sera réalisé en PE 32 et non en PE 40.</p> <p>L'antenne en 40 prévue pour alimenter la parcelle 97 sera remplacée par 2 branchements distincts (chemin privé).</p> <p>Un sondage a été réalisé sur l'accotement, celui-ci a révélé la présence de la conduite existante, une volante sera mise en place pour permettre la pose de la nouvelle conduite en lieu et place de l'ancienne (attention lors des périodes de gel).</p> <p>↳ La STAP a préféré mettre en place la conduite sous voirie après avoir accroché la conduite existante plusieurs fois.</p>	PM	Tous

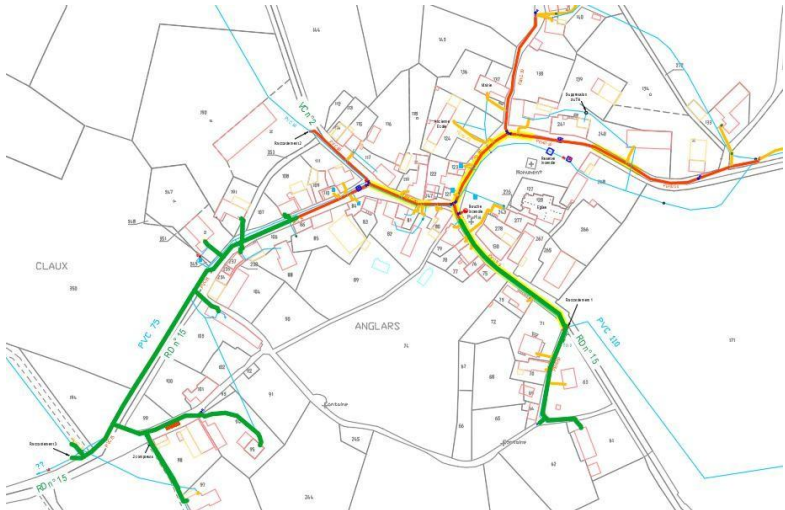


## S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village  
Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS

CR n°3 du 10-12-25.docx

### 3.3 Avancement des travaux

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
Passage Farral	Travaux terminés (hors réfection de voirie). ↳ Reste la tête de vidange béton à faire.	PM	STAP
RD 15 Côté stade	Réseau AEP posé jusqu'au carrefour. Les 3 branchements ont été réalisés et sont prêts à être raccordés.	PM	STAP
Antenne en PE 40 vers Rudelle	Antenne en PE 40 posée et remblayée, reste la tête de vidange à faire Branchement parcelle 94 posé et remblayé, remise en état effectuée. Les 2 branchements de la parcelle 97 ont également été réalisés.	PM	STAP
RD 15 Route de Rueyres	La conduite en PVC 75 mm a été posée sous voirie en direction du Bourg. Les branchements sont réalisés à l'avancement. 4 branchements ont été réalisés, le 5 <sup>ème</sup> est en cours. Un branchement non répertorié a été découvert (parcelle 85), le propriétaire a été rencontré et doit confirmer ce jour son souhait pour le nouvel emplacement de son regard de compteur. La GE a été mise en place sur la fin mais il reste la 1 <sup>ère</sup> partie à réaliser ( <u>avant les congés</u> ). ↳ 0/31,5 à décaper au préalable pour avoir la hauteur demandée par le STR.	PM	STAP
Vue générale	 <p><b>Légende : Trait rouge = partie restante, trait vert = partie terminée</b></p>	PM	Tous

	<b>S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA</b>	CR n°3 du 10-12-25.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

## 4 Suivis

### 4.1 Planning prévisionnel

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
Planning	<u>Semaines 50-51 :</u> Pose des réseaux en direction de la place.  <u>Semaine 52-53 :</u> congé de l'entreprise	PM	STAP

### 4.2 Documents remis

Documents	Observation(s)	Date limite
Plan EXE	En cours de VISA	-
Convention de dépôt de remblai		

### 4.3 Documents à remettre

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Copie du constat d'huissier</i>		PM
<i>Permissions de voirie et arrêtés de circulation</i>		<b>Immédiat</b>



## S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village  
Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS

CR n°3 du 10-12-  
25.docx

### 5 Constat

RD 15 route de Rueyres		Observations
Moyen humains et matériels	2 équipes sur site (1 route de Rueyres et 1 route du stade) 7 personnes STAP ; 2 camions, 3 pelles	Soleil ; t° 6 degrés
Dimension tranchée	0,6m x 1,2m environ	
Conduite	PVC 75 mm – PN 16 bars	
Blindage	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Rocher	<input type="checkbox"/> Pelle <input type="checkbox"/> Brise Roche Non <input checked="" type="checkbox"/>	Tout venant
Lit de pose	<input type="checkbox"/> Sable <input checked="" type="checkbox"/> Gravette Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>	
Remblais	<input checked="" type="checkbox"/> 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>	
Venues d'eau	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Compactage	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Non requis <input type="checkbox"/>	A la plaque vibrante

### Sécurité, environnement du chantier :

		Observations
Sécurité des tiers : signalisation et balisage corrects	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Sécurité du personnel correcte : casques, chauss. Sécurité, etc.	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Propreté du chantier satisfaisante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Alternat par feux	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Route barrée	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Affichage de l'arrêté de voirie	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Cabane de chantier	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	



*Tranchée commune PVC 110mm rte du stade*



*Partie remblayée rte du stade*



*Partie remblayée route de Rueyres*



*Pose en cours PVC 75mm route de Rueyres*
