


	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°5 du 28-01-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	



S.M. du Limargue et Ségala

Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village
Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS

Compte rendu n°: 5

Réunion du : Mercredi 28 janvier 2026

Prochaine réunion : A confirmer (pour la partie AEP)

Lieu : Sur site

Légende : Élément urgent, élément nouveau, P.M. = pour mémoire

Sans observation écrite de votre part sous 7 jours, le présent compte rendu est réputé accepté.
Le 29 janvier 2026

MONTANT DU MARCHÉ (partie AEP)			
LOT N°1 : Voirie / Réseaux divers Groupement d'entreprises STAP / GREGORY			176 127,10 € HT
AVANCE FORFAITAIRE			
L'entreprise a indiqué dans l'acte d'engagement le souhait de ne pas solliciter l'avance forfaitaire.			
GARANTIE A 1 ^{er} DEMANDE OU RETENUE DE GARANTIE			
Garantie à première demande transmise par la STAP			
ORDRES DE SERVICE ET PV			
Objet	Observations	Date	Date délai final (hors jours d'intempérie)
Délais d'exécution	6,5 mois	-	-
Notification du marché	18/02/2025	-	-
Ordre de Service 1	Période de préparation à compter du	01/09/2025	27/10/2025
Ordre de Service 2	Démarrage du délai d'exécution	27/10/2025	11/05/2026
AVANCEE DU MARCHÉ			
Situations	Date et observation		Montant (€ HT)
N°1	Validée et transmise le 08/12 au syndicat pour mandatement		51 749,00
N°2	Projet validé, version définitive à transmettre au Syded		37 428,55
Total facturation			89 177,55

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°5 du 28-01-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

1 Rappel du contexte

Nature	Observations	Responsable
<i>Renouvellement de réseau AEP</i>	<p>Les travaux consistent à renouveler le réseau AEP en parallèle des travaux de l'opération cœur de village d'ANGLARS.</p> <p>Les compteurs seront également déplacés en limite de domaine public (35 unités concernées).</p> <p>Une partie des travaux sera réalisée en tranchée commune (255 ml) avec le réseau d'eau pluvial et une partie en tranchée seule (1145 ml).</p>	PM

2 Aspects administratifs

Historique cf. CR n°4

Documents	Observations	Avancée / date	Responsable
<i>Planning prévisionnel</i>	<p>Version 1 remise le 29/08/2025.</p> <p>↳ A mettre à jour durant les travaux en fonction de l'avancement.</p>	PM	STAP
<i>Jours intempérie</i>	Intempérie le 06/11, le 07/11, la semaine du 05 au 09/01/26.	PM	STAP

2.1 Agrément des matériaux

Historique cf. CR n°2

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Généralités</i>	Tous les équipements doivent impérativement être validés par le Syded et disposer d'une ACS en cours de validité.	PM	STAP
<i>Fiches produits manquantes</i>	ACS reçue pour la conduite en PVC FITT. Manque la fiche produit.	URGENT 2^{ème} RAPPEL	STAP

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°5 du 28-01-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

3 Aspects techniques

3.1 Organisation, base de vie, stockage des matériaux, évacuation

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
<i>Organisation</i>	Le groupement précise que la STAP s'occupera de la pose des réseaux EP et AEP ainsi que des aménagements de voirie et l'entreprise Gregory des revêtements de voirie.	PM	Tous
<i>Remarque générale</i>	<p>Dans le cas des tranchées communes, veillez à ce que les conduites soient à minima espacées de 15cm et que celles-ci soient espacées également à minima de 15cm de la paroi pour permettre un bon enrobage.</p> <p>Pour rappel, il est demandé une couverture de 1m au-dessus des conduites pour la partie AEP.</p>	PM	STAP
<i>Stockage des matériaux</i>	Zone de stockage des matériaux derrière la mairie ainsi que sur le délaissé qui se trouve à côté du stade	PM	Groupement
<i>Base de vie</i>	La base de vie a été installée derrière la mairie.	PM	Groupement
<i>Evacuation des matériaux</i>	<p>Bordereau d'évacuation des déchets à faire signer quand dépôt important chez particulier.</p> <p>Evacuation à Espeyroux chez un agriculteur, convention signée</p> <p>📄 Copie remise</p>	PM	STAP

3.2 Piquetage et modifications du tracé

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
<i>Piquetage</i>	<p>Effectué le 22/10/2025 pour le passage Farral.</p> <p>Effectué le 13/11/2025, pour tt le reste du chantier.</p>	PM	Tous
<i>Modification par rapport au projet initial</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Découverte d'un branchement non recensé parcelle 85 à un particulier. => Brcht fait - Demande de branchement neuf parcelle 247 (devis entreprise en cours, principe validé par le demandeur). => Brcht fait - Ajout d'un branchement parcelle 114, actuellement 2 maisons alimentées par le même compteur (devis à faire). => A faire - Suppression de la ventouse route de Rudelle avec une surprofondeur. => Fait 	PM	Tous

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°5 du 28-01-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	


	<p>- Il faudra aller voir route de Rudelle pour ajouter une ventouse sur le réseau existant (point haut non ventosé aprioris).</p> <p>- Le branchement prévu parcelle 241 ne sera pas réalisé. Le propriétaire souhaite conserver 1 seul abonnement pour ses 3 bâtiments.</p>		
--	---	--	--

3.3 Avancement des travaux

Objet	Observation (s)	Avancée / Date	Responsable
Passage Farral	Travaux terminés (hors réfection de voirie). ↳ Reste la tête de vidange béton à faire.	PM	STAP
RD 15 Côté stade	Réseau AEP posé jusqu'au carrefour. Tous les branchements ont été réalisés et sont prêt à être raccordés.	PM	STAP
Antenne en PE 40 vers Rudelle	Antenne en PE 40 posée et remblayée, reste la tête de vidange à faire Branchement parcelle 94 posé et remblayé, remise en état effectuée. Les 2 branchements de la parcelle 97 ont également été réalisés. ↳ reste les réfections de voirie à faire	PM	STAP
RD 15 Route de Rueyres	La conduite en PVC 75 mm a été posée. Les branchements ont été réalisés et sont prêt à être raccordés. ↳ Des nids de poule ce sont formés => à reprendre avec de l'enrobé à froid dans l'attente de la réfection définitive.	PM	STAP
Place de l'église	La conduite existante en PVC 110 mm a été mise en place ainsi que les branchements et les regards de compteur.	PM	STAP
Ruelle de la mairie	La pose de la conduite est en cours. Le branchement de la mairie ainsi que celui de l'ancienne école ont été réalisés. Reste le regard ainsi que la nourrice à 3 départs à mettre pour l'ancienne école. ↳ A faire rapidement pour reboucher le trou communiquant avec le vide sanitaire. <u>Il est constaté que la nouvelle conduite est peu profonde, il est demandé à la STAP d'approfondir celle-ci (1m au-dessus de la conduite demandé au CCTP).</u>	PM	STAP

RD 48 vers RN 140	<p>La pose de la conduite en PEHD 50 mm est en cours. La conduite existante en PVC 40 mm a été accrochée ce jour vers 10h30 et réparée vers 12h30.</p> <p><u>Il est constaté que la nouvelle conduite est peu profonde, il est demandé à la STAP d'approfondir celle-ci (1m au-dessus de la conduite demandé au CCTP).</u></p>	PM	STAP
----------------------	--	----	------

Vue générale :

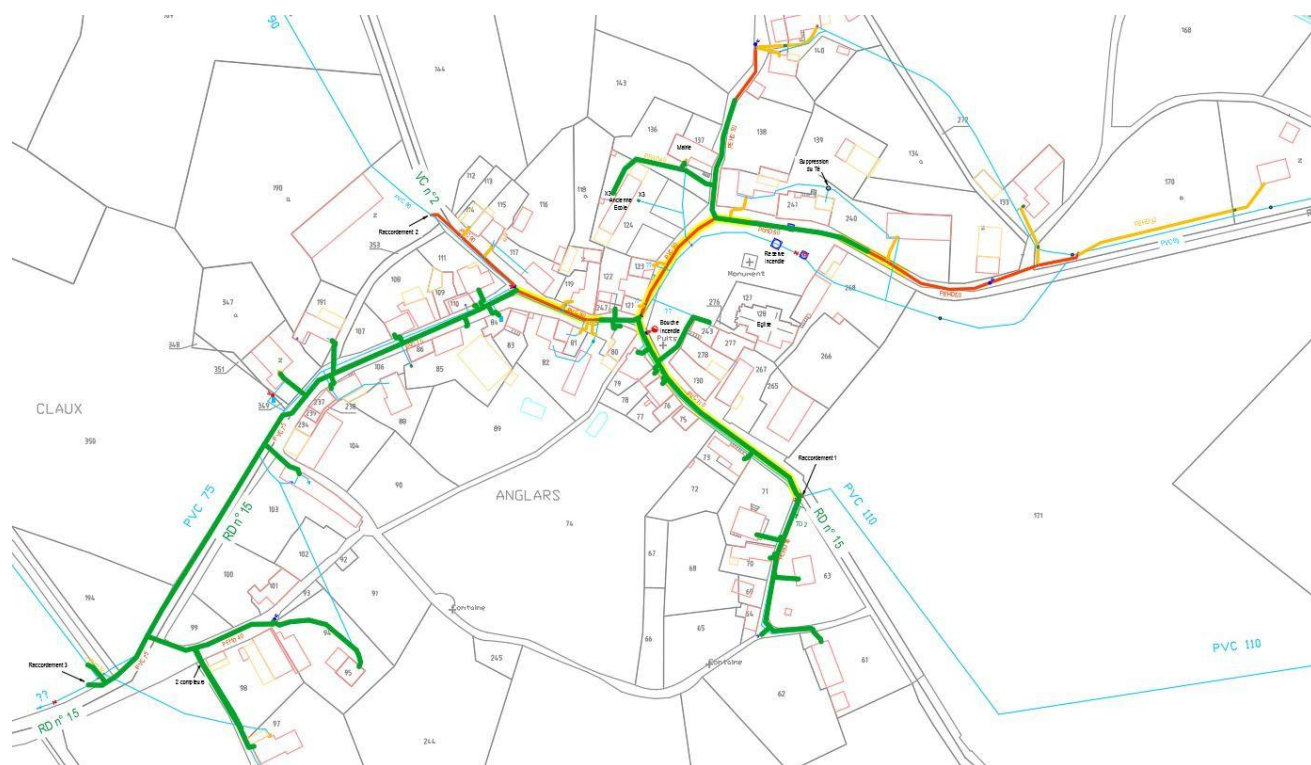

Légende : *Trait rouge = partie restante, trait vert = partie terminée*

3.4 Mise en service

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
<i>Essai pression</i>	Essai pression à faire à 1,5 fois la pression de service ou à un minimum de 8 bars => A valider sur site avec le Syded	PM	STAP Syded
<i>Rinçage, désinfection et Analyse potabilité</i>	Rinçage, désinfection et analyse potabilité de type D1 à réaliser avant raccordements. 👉 Attention prélèvement à faire par le laboratoire directement	PM	STAP Syded
<i>Raccordements / Mise en service</i>	Prévenir au plus tôt afin d'informer les riverains de la coupure d'eau.	PM	STAP

	S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA	CR n°5 du 28-01-26.docx
	Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village <i>Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS</i>	

4 Suivis

4.1 Planning prévisionnel

Objet	Observation(s)	Avancée / date	Responsable
Planning	<u>Semaines 05-06 :</u> - Poursuite de la pose dans la ruelle de la mairie et réalisation des 2 branchements. - Poursuite des terrassements vers RN 140	PM	STAP

4.2 Documents remis

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Projet de situation n°2</i>	Validé, en attente version définitive	-

4.3 Documents à remettre

Documents	Observation(s)	Date limite
<i>Copie du constat d'huissier</i>		PM



S.M. DU LIMARGUE ET SEGALA

Programme 2022 (réalisé en 2025) – Opération cœur de village
Renouvellement de réseau AEP Commune d'ANGLARS

CR n°5 du 28-01-
26.docx

5 Constat

		Vers RN 140	Observations
Moyen humains et matériels	2 équipes sur site (1 ruelle de la mairie et 1 vers RN 140) 6 personnes STAP ; 2 camions, 3 pelles		Pluie ; t° 3 degrés
Dimension tranchée	1m x 1,2m environ		Conduite AEP à approfondir
Conduite	PEHD 50 mm – PN 16 bars		
Blindage	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Rocher	<input type="checkbox"/> Pelle <input type="checkbox"/> Brise Roche Non <input checked="" type="checkbox"/>		Brasier (tendre)
Lit de pose	<input type="checkbox"/> Sable <input checked="" type="checkbox"/> Gravette Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>		
Remblais	<input checked="" type="checkbox"/> 0/31,5 Matériaux extraits de la fouille <input type="checkbox"/>		
Venues d'eau	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non		
Compactage	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non Non requis <input type="checkbox"/>		A la plaque vibrante

Sécurité, environnement du chantier :

		Observations
Sécurité des tiers : signalisation et balisage corrects	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Sécurité du personnel correcte : casques, chauss. Sécurité, etc.	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Propreté du chantier satisfaisante	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Alternat par feux	<input type="checkbox"/> Oui <input checked="" type="checkbox"/> Non	
Route barrée	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Affichage de l'arrêté de voirie	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	
Cabane de chantier	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	



Pose conduite en PEHD 50 vers RN 140



Pose conduite en PVC 75 mm



Antenne en 40 pour alim. 3 brchts de l'ancienne école



Tranchée remblayée vers la place de l'église
